

Corte transversal

COMPUTO Y PRESUPUESTO

ESTRUCTURA

Tubo 100 x 50 x 2 mm x 6 mts.	12	unid.	\$861.265,66
Tubo 100 x 100 x 2 mm. X 6 mts.	3	unid.	\$302.234,89
Perfil C galvanizado de 100 mm. 12 mts	1	unid.	\$82.836,60
Platina de 3/8 de 300x300 mm	4	unid.	\$108.580,00
Flete CODIMAT			\$35.000,46
Plegados para contener panel (M.O. + Materiales)	40	ml.	\$580.000,00
Plegados cenefas M.O.	40	ml.	\$160.000,00
Chapa prepintada blanca 1,22 x 2,44	4	unid.	\$191.810,00
Epoxi Revesta x 4 lts.			\$272.726,00
Diluyente Epoxi Revesta x 1 lt.			\$54.668,00
Rodillo p/epoxi.			\$3.854,00

PISO

Chapa antideslizante Aluminio 1,25x2,50 x 2.7mm	5	unid.	\$2.242.125,00
Pintura Fibrada x 10 lts.	1	unid.	\$122.709,00
Placa OSB de 1,22 x 2,44 x 25mm	7	unid.	\$350.638,36
Zócalo Plástico Sanitario de PVC	16	ml.	\$140.780,73
Pegamento p/colocación de zócalo sanitario	6	unid.	\$43.479,76
Cajón galvanizado para rejilla		global	\$150.000,00
Planchuela 1 x ½ x 6 mts.	2	unid.	\$18.636,42
Angulo de 1 ¼ x 1/8 x 6 mts.	2	unid.	\$26.128,74

CIELORRASO

Machimbre pvc 20 x 3 mm x 6 mts.	20	unid.	\$351.791,29
Perfil terminación p/perímetro bco.	16	ml.	\$23.558,37
Tornillos T1 punta aguja	500	unid.	\$10.877,90

CERRAMIENTO LATERAL Y TECHO

FRONT (PIR) (50mm, Blanco 0.5, Blanco 0.5	47,88	m2	\$3.558.770,20
			u\$s 2071,22 + IVA
COVER LS (PIR) (50mm, Blanco 0.5, Foil Blanco)	16	m2	\$855.526,14
			u\$s 497,92 + IVA
Flete (Rosario)	\$300.000,00	aprox.	
Sellador de silicona neutra blanco x cartucho	6	unid.	\$123.698,99
Otros (tornillos de anclaje, codos de desagüe, etc.)			\$150.000,00
Canaleta exterior + caño de bajada		global	\$470.000,00

METALURGICA

Construcción de módulo de 4x4x3, instalación y adaptación al edificio existente.

Mano de obra y consumibles \$8.595.840,00

Incluye M.O. y consumibles.

En caso de no tener que emitir factura se podrá considerar el 21% menos.

COSTO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

(sin traslado a fábrica e Hidrogrúa) \$ 20.187.536,52



NOTA: Hay que considerar el costo del traslado en carretón y la hidrogrúa para bajar el módulo en fábrica

El plazo de entrega de la panelería térmica está en 30 a 35 días.

No está considerada la provisión de energía eléctrica, de agua, instalación interna e iluminación.

HONORARIOS ARQ.:

DISEÑO, COMPUTO y PRESUPUESTACIÓN + DIRECCIÓN 8% del Costo Total

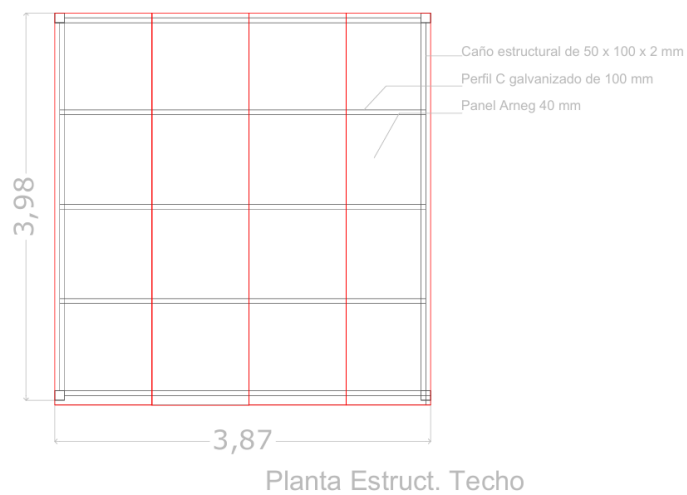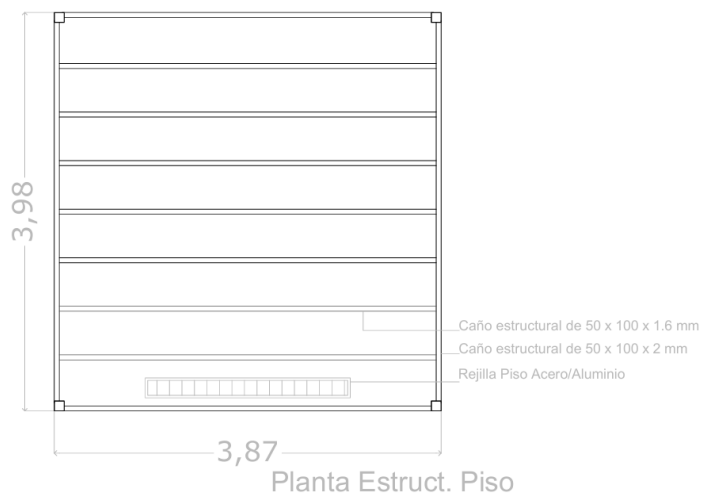

Arq. Gabriel R. Granada

Mat. 20246
