


Cronograma de Ejecución — Diagrama de Gantt

Sabor Pampeano | Plan de Readecuación | 24 semanas

Cronograma de Ejecución — Diagrama de Gantt

Sabor Pampeano | Plan de Readecuación | 24 semanas

Cronograma de Ejecución — 24 Semanas.

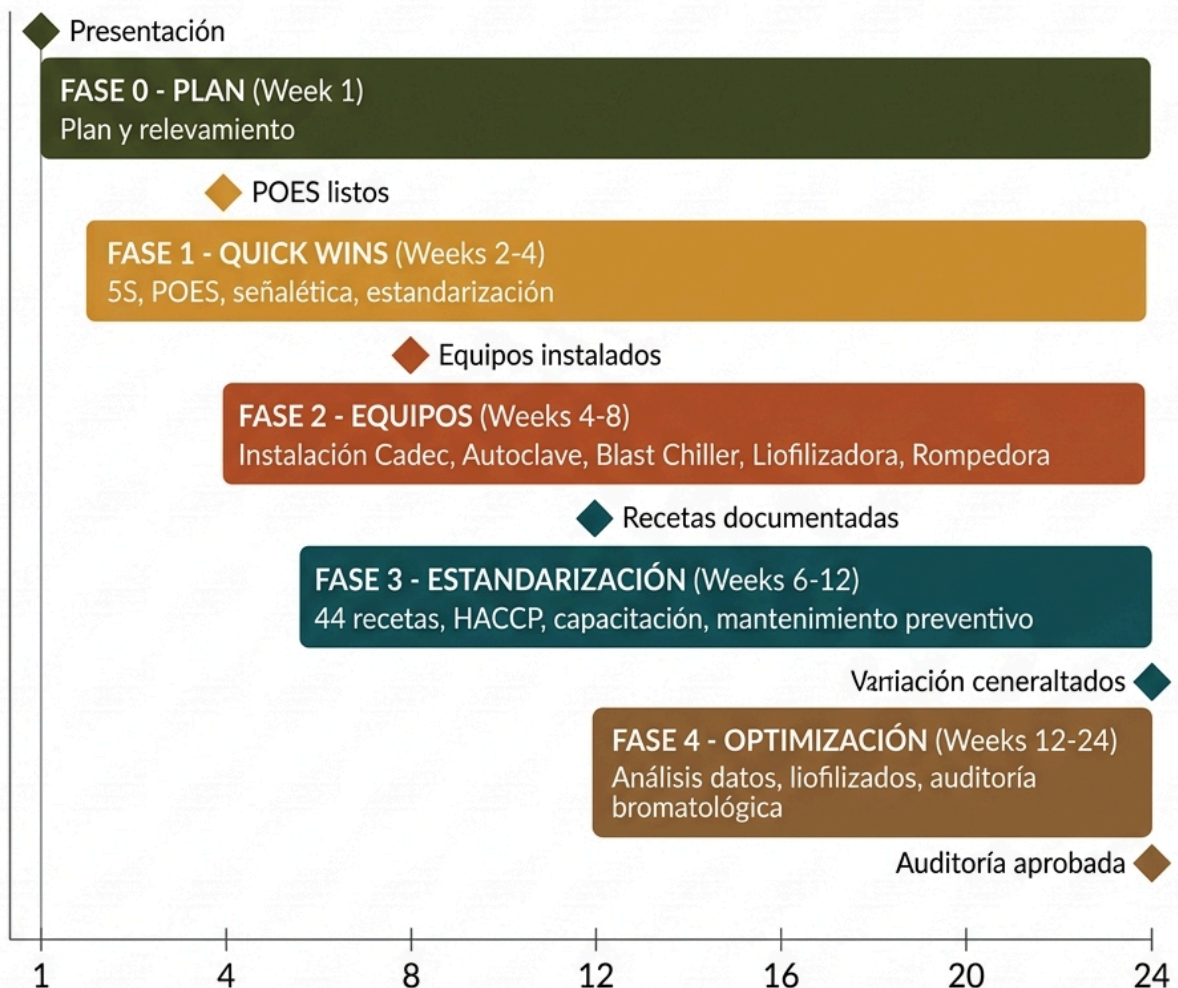

Hitos Clave

Semana	Hito	Fecha aprox.
1	✔ Presentación al dueño	27 Abril
4	✔ POES implementados + etiquetadora reparada	18 Mayo
6	✔ Línea Cadec operativa	1 Junio
8	✔ Todos los equipos instalados y probados	15 Junio
12	✔ 44 recetas documentadas + HACCP	13 Julio
16	✔ Plan mantenimiento preventivo activo	10 Agosto
24	✔ Auditoría bromatológica aprobada	5 Octubre

Ruta Crítica

Las actividades que **no pueden retrasarse** sin afectar el plan completo:

Presentación dueño → 5S + POES → Electricista → Instalación Cadec
→ Instalación Autoclave → Pruebas línea → Estandarización recetas → Auditoría

ATENCIÓN: Dependencia externa: La consulta con el electricista industrial (Fase 2) condiciona TODA la instalación de equipos. Si se retrasa, se retrasan las Fases 2, 3 y 4. Programar con urgencia.

Sabor Pampeano — Plan Maestro de Readecuación — Abril 2026
